UNIONE EUROPEA
AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

Fondi Strutturali Europei
PON 2007/2013

MIUR

Programma Operativo
FESR Calabria 2007/2013

comune di **SANTA DOMENICA TALAO**
provincia di cosenza/ regione calabria

PROGRAMMA OPERATIVO FESR
Ambiente per l'apprendimento
Asse II, Ob C - Qualità degli ambienti scolastici

PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA "LOCALITA' GUARNIERO"

commitente
dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo "GREGORIO CALOPRESE"
R.U.P.: prof.ssa FILOMENA D'AMANTE

coll. R.U.P.: arch. GIAMPIETRO D'ALESSANDRO
tecnico Comune di Scalea

via Fazio degli Uberti
SCALEA (CS)

progettista
ing. PASQUALE FILICETTI

via G. Petrellis, 29
BELVEDERE M.MO (CS)

collaboratori
arch. SILVIA LOPEZ SPINELLI
ing. SIMONE DE SANTO
geom. RAFFAELE TRIBUZIO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

tavola	scala	aggiornamento	data
PE 2.5		progetto definitivo	aprile 2013
		progetto esecutivo	
		NAS / LAV / 468 / PE.13	

GEOSTRU
Studio ass.to d'Ingegneria
Belvedere M.mo via G.Petrellis - tel. 0985-849109
e-mail: info@geo-stru.it

questo disegno è proprietà della GEOSTRU e non può essere copiato, ridotto, mostrato a terzi senza ns. autorizzazione.

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	DIAGRAMMA DI GANTT	01/04/2014	30/07/2014	120
2	B	Allestimento cantiere	01/04/2014	07/04/2014	6
3	C.1	Delimitazione delle aree di cantiere	04/04/2014	07/04/2014	3
4	C.2	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	07/04/2014	09/04/2014	2
5	C.3	Rimozione di infissi interni	08/04/2014	10/04/2014	2
6	C.4	Demolizioni tramezzature per adeguamento servizi igienici	10/04/2014	16/04/2014	6
7	C.5	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	16/04/2014	22/04/2014	6
8	C.6	Demolizione di tubazioni e parti di impianto idraulico esistente	22/04/2014	26/04/2014	4
9	C.7	Realizzazione di tramezzature per rimodulazione servizi igienici	26/04/2014	06/05/2014	10
10	C.8	Realizzazione impianto idrico di alimentazione e di scarico	06/05/2014	16/05/2014	10
11	C.9	Realizzazione e rimodulazione impianto elettrico	06/05/2014	21/05/2014	15
12	C.10	Rifacimento intonaco interno nelle zone di intervento	18/05/2014	24/05/2014	6
13	C.11	Rifacimento dei pavimenti e rivestimenti nei locali interni interessati dai lavori	24/05/2014	08/06/2014	15
14	C.12	Montaggio infissi interno per ripristino locali interessati dai lavori	08/06/2014	11/06/2014	3
15	C.13	Rimozione infissi esterni da sostituire	01/06/2014	06/06/2014	5
16	C.14	Montaggio infissi esterni	06/06/2014	16/06/2014	10
17	C.15	Tinteggiatura pareti interne	29/05/2014	23/06/2014	25
18	C.16	Montaggio idro-sanitari ed accessori vari	23/06/2014	28/06/2014	5
19	C.17	Scavi e demolizioni per la realizzazione della sistemazione delle aree esterne	08/06/2014	13/06/2014	5
20	C.18	Delimitazione dell'area giochi mediante cordolo in c.a. e recinzione con rete	13/06/2014	23/06/2014	10
21	C.19	Pavimentazione e completamento area giochi	23/06/2014	05/07/2014	12
22	C.20	Pavimentazione area antistante l'ingresso	05/07/2014	20/07/2014	15
23	D.1	Pulizia delle aree di cantiere e smaltimento dei materiali di risulta	20/07/2014	26/07/2014	6
24	D.2	Verifica e collaudo degli impianti	26/07/2014	28/07/2014	2
25	D.3	SMOBILIZZO CANT. FINE LAVORI	28/07/2014	30/07/2014	2

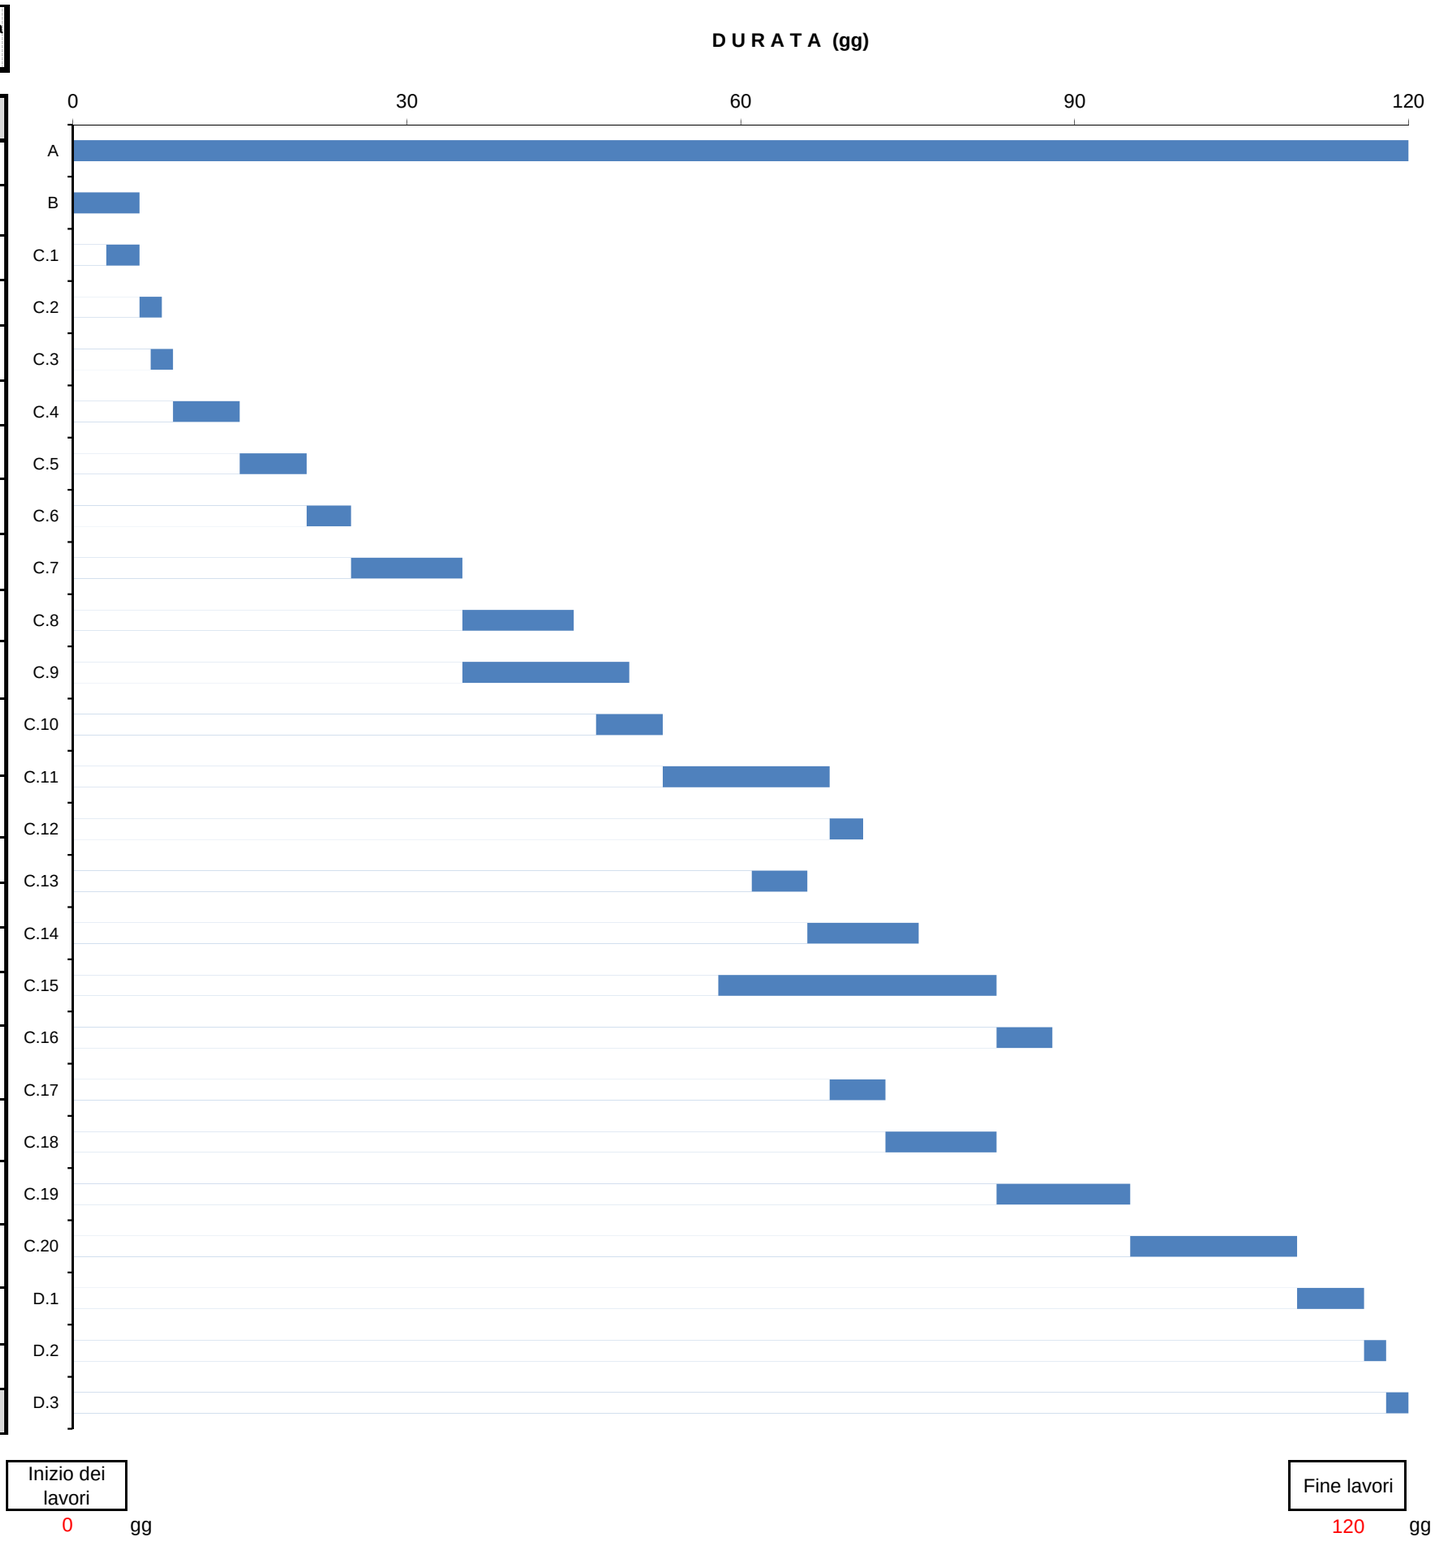

TC **120** gg.

naturali consecutivi
